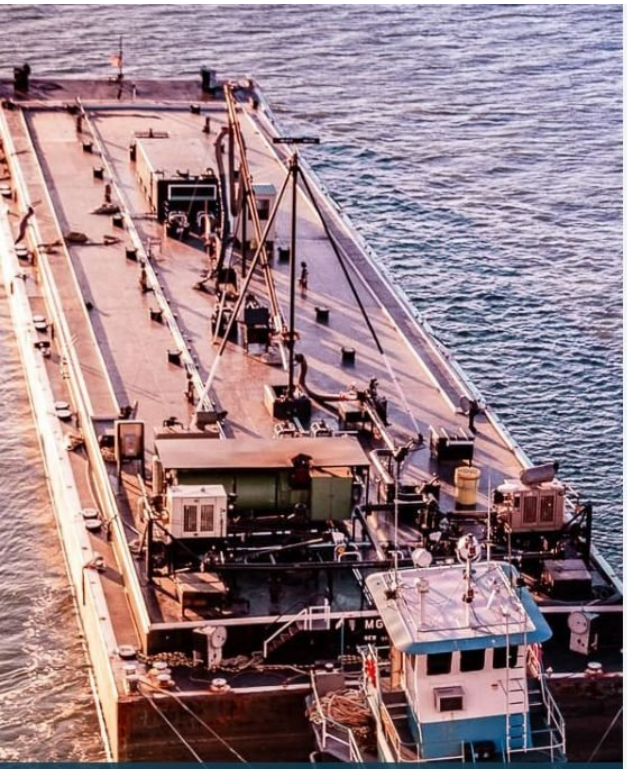


42 kontrak freight, 7 di antaranya rugi

Satu kontrak panjang bisa menghapus untung sebulan.

[redacted]

Analitika Bisnis S2, Data Storytelling

Topik

Apa yang membuat 7 kontrak angkut laut berakhir rugi?

Saya mengamati 42 kontrak freight periode Januari sampai Juli 2026. Muatannya macam-macam, mulai dari CPO, B40, sampai Pertalite. Dari data itu saya mencari ciri kontrak yang rugi.

Konteks



Sebelum kapal berangkat, perusahaan sudah harus memberi tarif freight (FR) kepada charterer. Biaya riil (CF) baru diketahui setelah pelayaran selesai.


Kontrak rugi ketika CF melebihi FR.

hasil = (FR − CF) × muatan

Webinar [redacted] menyebut hitung manual makan 2,5 jam sampai 1 hari per penawaran, dengan salah estimasi sekitar 12%.

Data

Untung dan rugi kontrak per bulan (Rp juta)

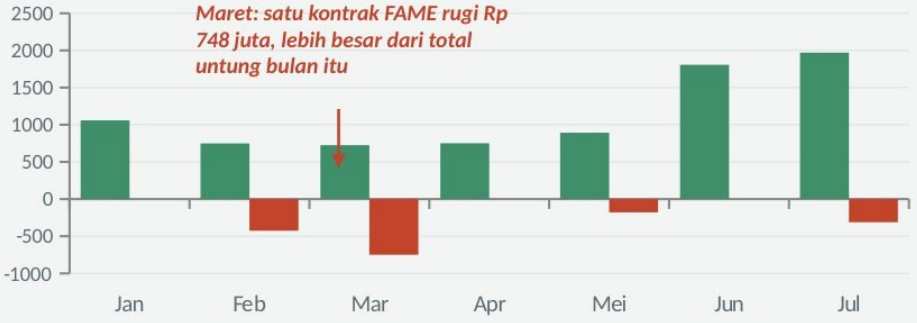

42 kontrak diamati

35 untung (83%)

7 rugi (17%)

Cerita

Dari data tersebut, 7 kontrak rugi dengan total **Rp 1,66 miliar**.

Biaya riil di ketujuh kontrak itu melewati tarif. Selisihnya mulai dari 1% sampai 52% pada CPO Sei Kerang bulan Juli.

Kontrak rugi juga berjalan lebih lama. Rata-rata voyage-nya 17 hari dan laytime 12 hari, sedangkan kontrak untung 7 hari dan 5 hari.

Kontrak FAME Bontang–Ambon paling parah: voyage 40 hari, laytime 31 hari, rugi Rp 748 juta. Maret pun tutup minus.

Kesimpulan

Kerugian terpusat pada kontrak yang waktunya molor dan biayanya meleset dari perkiraan. Tarif perlu dihitung lebih teliti sebelum disepakati, terutama untuk rute jauh.

Catatan: baru 7 kontrak, jadi ini indikasi awal.

Untuk diskusi kelas

1. Selisih FR–CF itu dari estimasi yang meleset atau kejadian di lapangan (antre, cuaca, demurrage)?
2. Perlu batas laytime yang memicu tarif tambahan?
3. Angka untung Jan dan Apr di tabel ringkasan dan rincian berbeda. Pakai yang mana?

Sumber: PPT Webinar [redacted] "Industry Insight & Problem Solving" (11 Sep 2026), slide rekap freight Jan–Jul 2026. Rata-rata voyage dan laytime dihitung dari rincian transaksi di slide. Untung dan rugi per bulan mengikuti tabel ringkasan.
